


Interventi attuati da CAL connessi ai Giochi Olimpici Invernali del 2026

AUDIZIONE V COMMISSIONE
CONSIGLIO REGIONALE

Milano, 7 novembre 2024



Interventi attuati da CAL in alta Valtellina

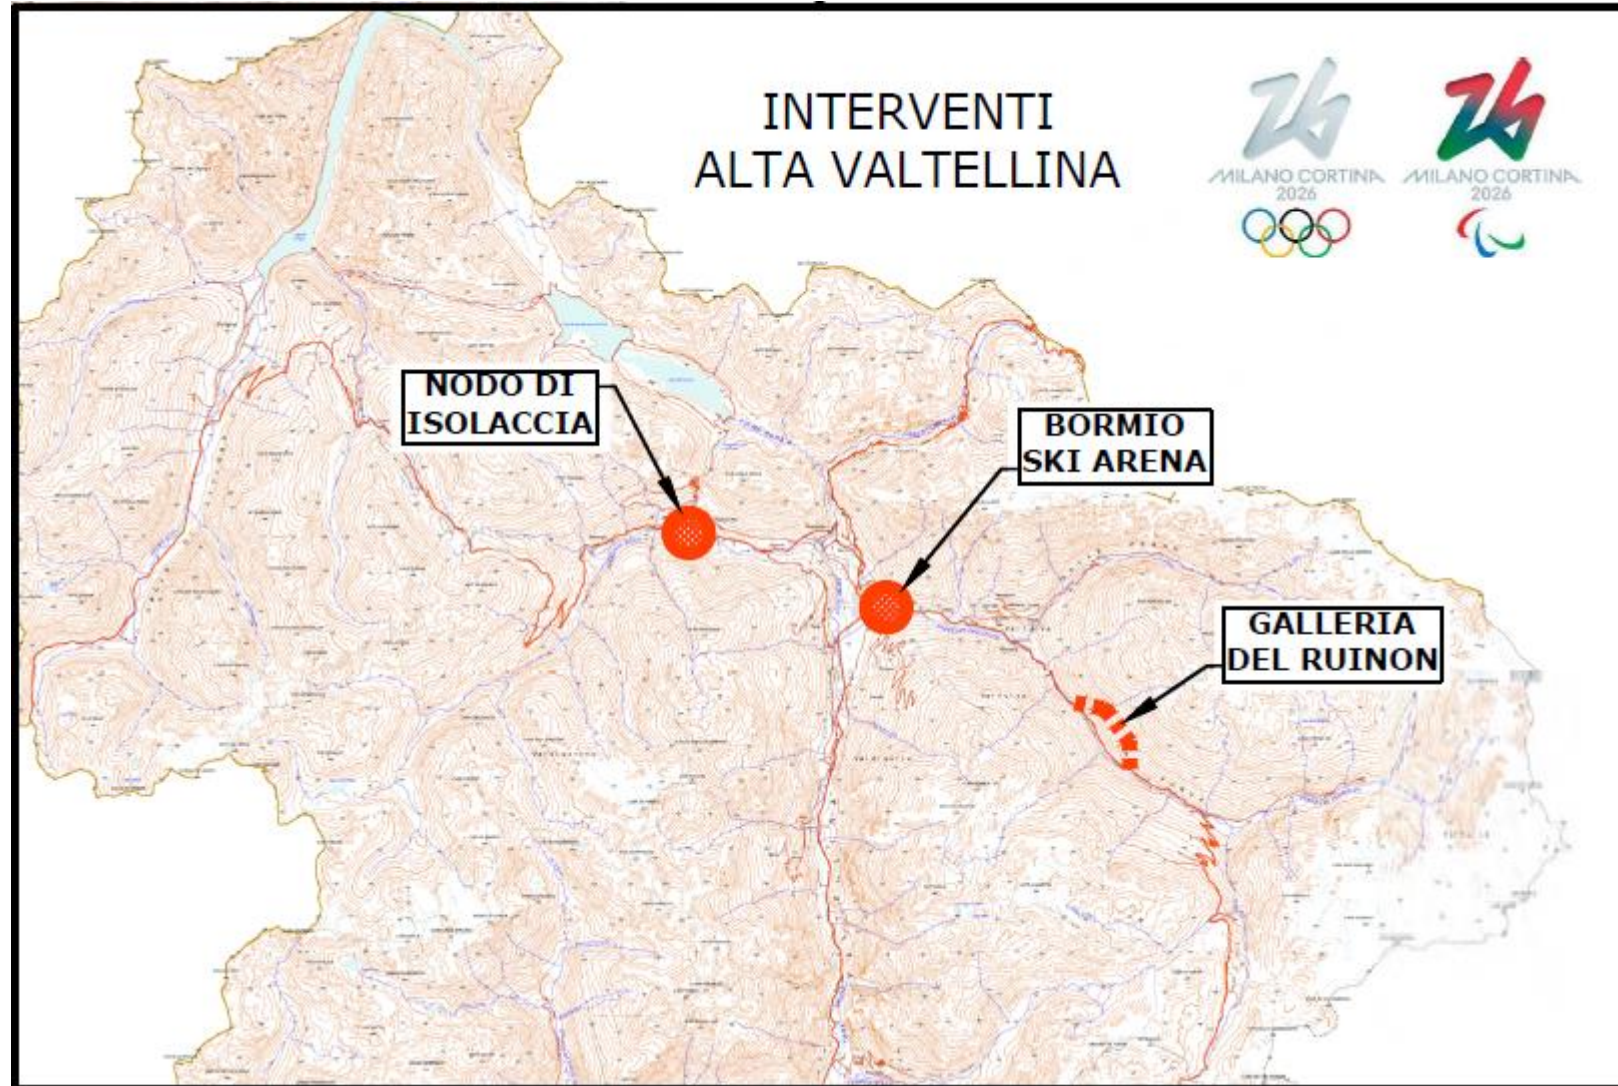

Bormio - Ski Stadium Family Lounge e Hospitality Lounge

12,9 M€



Passaggi pregressi:

- **10/04/2022:** firma dell' **Accordo di Collaborazione** Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL;
- **2022-2023:** redazione di tutte le fasi di **Progetto** (PFTE, PD e PE);
- **26/03/2024:** approvazione del **Progetto Esecutivo** da parte del Comune di Bormio;
- **04/04/2024:** avvio dei lavori di esecuzione;
- **31/10/2024:** avanzamento lavori pari al **30%**;

Prossimi step:

- **15/11/2024:** consegna anticipata al **Comune di Bormio**, parziale e provvisoria, di strutture esterne **Family Lounge** (per eventi Coppa del Mondo);
- **31/12/2025:** fine dei lavori di esecuzione;

Area Ski Stadium (fino a marzo 2024)



Area Ski Stadium – novembre 2024



- 🕒 Archivio
- 📍 Punto d'interesse
- 📄 Info telecamera

© feratel | Informativa sulla privacy

14.9°C

mar	mer	gio
☀️	☀️	☁️
3/13°	5/15°	4/11°

Work in Progress

Family Area



Work in Progress

Family Area



Work in Progress

Family Area



Work in Progress

Hospitality Area



Work in Progress

Hospitality Area





Olympic Family Lounge

Olympic Family Lounge





Hospitality Lounge





Hospitality Lounge



Bormio - Ski Park

Parcheeggio di Porta e Passerella sul Frodolfo

8,4 M€



Passaggi pregressi:

- **10/04/2022:** firma dell' **Accordo di Collaborazione** Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL;
- **2022-2023:** redazione di tutte le fasi di **Progetto** (PFTE, PD e PE);
- **24/05/2024:** approvazione del **Progetto Esecutivo** da parte del Comune di Bormio;
- **10/09/2024:** avvio dei lavori di esecuzione;
- **31/10/2024:** avanzamento lavori pari al **5%**;

Prossimi step:

- **30/05/2025:** **Completamento Passerella sul Frodolfo** e sistemazione via Don Bertola con percorsi ciclopedonali;
- **31/12/2025:** **Completamento opere**

Bormio Ski Park (fino a settembre 2024)

Area Parcheggio di Porta



Work in Progress

Area Parcheggio di Porta – 7 novembre 2024



Work in Progress

Area Parcheggio di Porta



Work in Progress

Area Parcheggio di Porta



Bormio Ski Park (progetto)

Area Parcheggio di Porta



Bormio Ski Park (progetto)

Area Parcheggio di Porta



Bormio Ski Park (in 2023)

Area Passerella sul Frodolfo



Work in Progress

Area Passerella sul Frodolfo



Bormio Ski Park (progetto)

Area Passerella sul Frodolfo



Valdidentro - Isolaccia

Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici, con adeguamento SS301 "del Foscagno"



Valdidentro – Isolaccia – Progetto



Valdidentro – Isolaccia

Stato di attuazione

5,0 M€



Passaggi pregressi:

- **03/02/2022:** firma dell' **Accordo di Collaborazione** Regione Lombardia, Comune di Valdidentro e CAL;
- **2022-2024:** **redazione** di tutte le fasi di **Progetto** (PFTE, PD, PE);
- **18/06/2024:** **approvazione del Progetto Definitivo** da parte del Comune di Valdidentro;
- **30/11/2024:** **completamento del Progetto Esecutivo.**

Prossimi step:

- **31/12/2024:** **approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune di Valdidentro;**
- **01/06/2025:** **avvio lavori di esecuzione;**
- **31/12/2025:** **Completamento opere;**

Graxie per l'attenzione



CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE
